


## 議事(2) 重点プロジェクトについて

重点プロジェクトは、復興まちづくりにおける目標の実現に向けて、3つの方針ごとに重点的かつ優先的に取り組むべき施策やそれぞれの方針に共通する施策をまとめたものです。

復興まちづくり計画では、6つの重点プロジェクトを設定し、施策を展開していきます。

プロジェクト名	災害に強い	にぎわいのある	住み続けられる
①：大火に負けない消防力の強化プロジェクト	★		
②：大火を防ぐまちづくりプロジェクト	★		★
③：糸魚川らしいまちなみ再生プロジェクト	★	★	
④：にぎわいのあるまちづくりプロジェクト		★	
⑤：暮らしを支えるまちづくりプロジェクト			★
⑥：大火の記憶を次世代につなぐプロジェクト	★	★	★

### 【各プロジェクトの位置づけ】

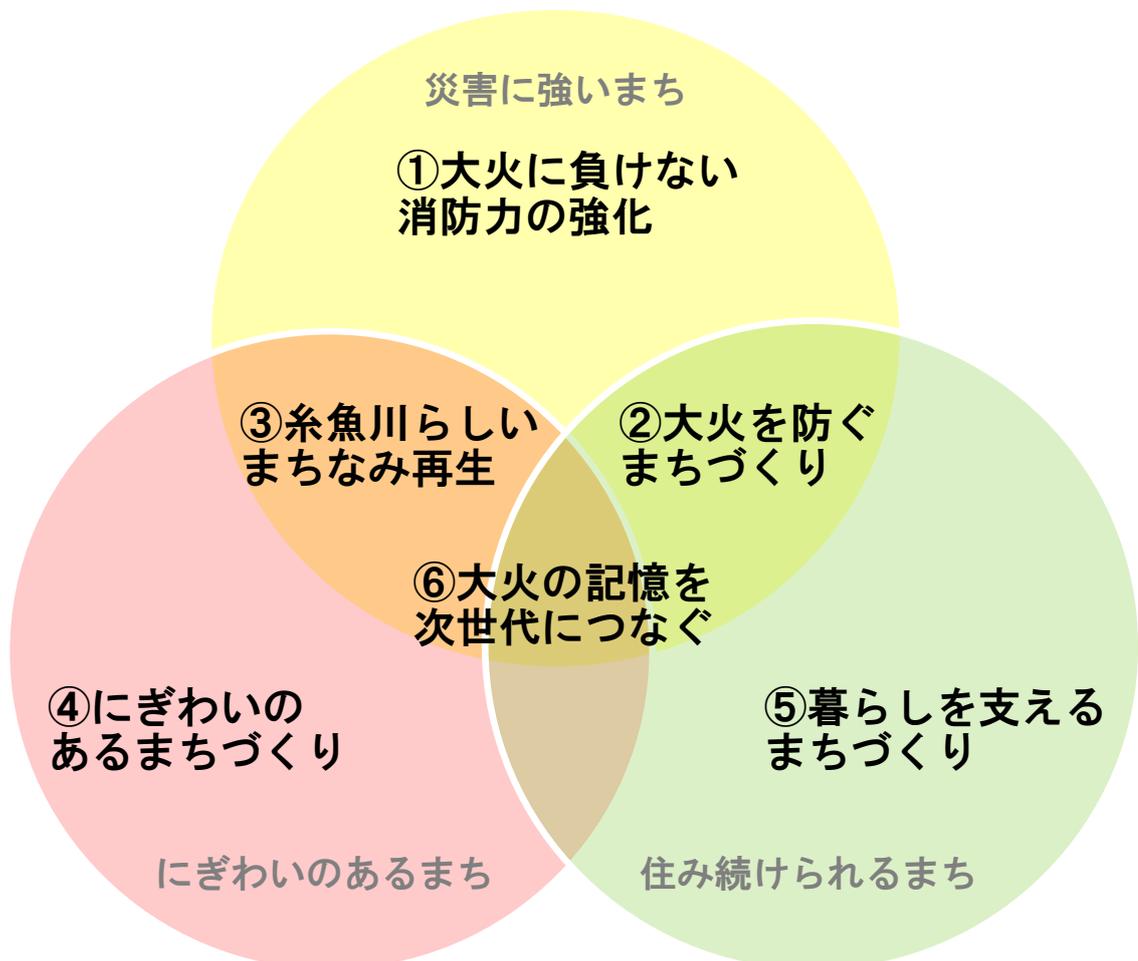

# ①：大火に負けない消防力の強化プロジェクト

目的	被災地を含む密集市街地での延焼防止に向けた消防基盤の拡充・整備とあわせ、消防体制の強化や自主防災組織など地域住民も含めた地域防災力の向上により、総合的に消防力を強化します。
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 奴奈川用水や海水などの活用検討</li> <li>・ 消火栓、防火水槽の増強</li> <li>・ 常備消防及び消防団の装備や体制の強化</li> <li>・ 関係機関、団体との応援協定の締結</li> <li>・ 防災意識の醸成</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>▲消防装備の強化</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>▲奴奈川用水の活用</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>▲公園下を活用した防火水槽の整備</p> </div> </div>
実施主体	住民、自治会、事業者、市

## ■実施スケジュール

施策名	年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度
		計画期	整備期			展開期
奴奈川用水や海水などの活用検討		整備計画策定 ・整備	整備・活用			
消火栓、防火水槽の増強		整備計画策定 ・整備	整備			
常備消防及び消防団の装備や体制の強化		装備の充実	体制の強化			
関係機関、団体との応援協定の締結		協定締結				
防災意識の醸成		出前講座等の実施				

## ②：大火を防ぐまちづくりプロジェクト

目的	<p>本町通りを延焼遮断帯として機能させるとともに、地区全体の建築物の不燃化を促進します。また、市道の拡幅や防災上有効な公園等の整備などにより、延焼の拡大を防止し、他の災害にも強いまちをつくります。</p>
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 本町通りにおける延焼遮断帯の形成</li> <li>・ 建築物の不燃化に対する支援</li> <li>・ 市道の拡幅（延焼防止や緊急車両の通行）と敷地の再編</li> <li>・ 延焼を防止し住民の集いの場となる公園・広場の整備</li> <li>・ 防災公園の整備（マンホールトイレ、備蓄倉庫などを併設）</li> </ul> <div style="text-align: center;">  <p>▲延焼遮断帯のイメージ</p> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>▲防災公園</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>▲マンホールトイレ</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>▲かまどベンチ</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>▲備蓄倉庫</p> </div> </div>

実施主体	住民、事業者、市
------	----------

### ■実施スケジュール

施策名	年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度
			計画期	整備期		
本町通りにおける延焼遮断帯の形成		要綱等作成～都市計画手続	都市計画決定～運用開始・建築			
建築物の不燃化に対する支援		制度内容・検討	実施			
市道の拡幅と敷地の再編		用地買収・設計	工事			
延焼を防止し住民の集いの場となる公園・広場の整備		用地買収・設計	工事			
防災公園の整備		用地買収・設計	工事			

### ③：糸魚川らしいまちなみ再生プロジェクト

目的	歴史的街道であった本町通りにおいて、雁木を含むまちなみ景観や酒蔵を含む魅力的な地域資源などを生かした、糸魚川らしいまちなみ景観の再生を推進します。
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 雁木の再生に向けた支援</li> <li>・ 地場産材等を活用した復興モデル住宅の推奨</li> <li>・ 外装に統一感をもった住宅や店舗の建築への支援</li> <li>・ 道路や歩道の美装化</li> <li>・ 無電柱化の推進</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div data-bbox="480 725 935 1066" style="text-align: center;">  <p>▲被災地近隣に残る雁木のまちなみ</p> </div> <div data-bbox="971 725 1426 1066" style="text-align: center;">  <p>▲無電柱化のイメージ (牧之通り：新潟県南魚沼市)</p> </div> </div>
実施主体	住民、事業者、市

#### ■実施スケジュール

施策名	年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度
		計画期	整備期			展開期
雁木の再生に向けた支援		ガイドライン等作成 ～都市計画手続	都市計画決定 ～運用開始			
地場産材等を活用した復興モデル住宅の推奨			実施			
外観に統一感をもった住宅や店舗の建築への支援		ガイドライン等作成 ～都市計画手続	都市計画決定 ～運用開始			
道路や歩道の美装化		設計	工事			
無電柱化の推進		調査・設計	工事			

## ④：にぎわいのあるまちづくりプロジェクト

目的	事業者の早期の事業再建を支援するとともに、中心市街地のにぎわいを高めるため、観光客、市民及び地域住民が集う新たなにぎわい創出拠点を整備します。
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・防災とにぎわいの拠点施設の整備 (大火の記憶を伝える防災メモリアル機能、子育てや福祉に関する相談窓口機能、教育相談や学習支援のための機能、移住に関する相談窓口機能、外部人材を活用した中間支援機能などを検討)</li> <li>・商店街等のにぎわい創出事業</li> <li>・ビジネスチャレンジ支援事業の拡充</li> <li>・観光協会と連携した防災等の視察ツアーの実施</li> <li>・日本海を生かした長野県方面からの誘客強化</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>▲まちなかの にぎわいの広場のイメージ図</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>▲にぎわいの拠点施設の整備のイメージ (御殿堰：山形県山形市)</p> </div> </div>
実施主体	事業者、商店街、商工団体、市

### ■実施スケジュール

施策名	年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度
		計画期	整備期			展開期
防災とにぎわいの拠点施設整備		機能の検討 運営事業者の検討	基本設計・実施設計・工事・拠点施設運営			
商店街等のにぎわい創出事業		にぎわい創出事業の実施				
ビジネスチャレンジ支援事業の拡充		拡充内容の検討	支援事業の実施			
観光協会と連携した防災等の視察ツアーの実施		ツアー実施 旅行会社との調整				
日本海を生かした長野県方面からの誘客強化		広域観光連携・大系線利用促進・松本系魚川連絡道路整備促進				

## ⑤：暮らしを支えるまちづくりプロジェクト

目的	幅広い世代が安心して生活できる住環境を提供するとともに、コミュニティ豊かにいきいきと住み続けられるまちをつくります。
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公営住宅の整備（福祉施設等の連携を検討）</li> <li>・ 復興まちづくりカフェの継続（地域づくりプランの策定を支援）</li> <li>・ 生活再建のための金融等の支援（借入への利子補給、固定資産税等の負担軽減、住宅再建に対する支援）</li> <li>・ 生活支援相談員の配置</li> <li>・ 健康づくりへの支援（医療介護費の一部助成、施設使用料の軽減）</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>▲ 1階に福祉施設を併設した共同住宅 (富山県射水市 リアン放生津)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>▲ 低層平屋建ての公営住宅</p> </div> </div>
実施主体	住民、事業者、市

### ■実施スケジュール

施策名	年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度
		計画期	整備期			展開期
公営住宅の整備		機能検討、設計、工事、供用開始				
復興まちづくりカフェの継続		実施				
生活再建のための金融等の支援		利子補給	住宅再建支援			
生活支援相談員の配置		相談員配置				
健康づくりへの支援		医療費助成等				

## ⑥：大火の記憶を次世代につなぐプロジェクト

目的	大火の記録を後世に伝えるために、防災・にぎわい拠点施設に防災メモリアル機能を導入し、防災活動拠点や防災教育・啓発の場とするとともに、被災地を中心に大火の記憶を伝承するツール(仕掛け)づくりを推進します。
主な施策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防災とにぎわいの拠点施設の整備(再掲)</li> <li>・ 復興まちづくり版マンホール蓋への更新</li> <li>・ 映像等を用いた防災教育の推進</li> <li>・ 防火と大火の記憶を受け継ぐ植樹の促進</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>▲災害シアター(イメージ)</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>▲ちびっこ消防士(イメージ)</p> </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>▲火災シミュレーター(横浜市民防災センター)</p> </div>
実施主体	住民、自治会、市

### ■実施スケジュール

施策名	年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度
			計画期	整備期		
復興まちづくり版マンホール蓋への更新			デザイン検討	蓋取替え工事		
映像等を用いた防災教育の推進		情報整理			実施	
防火と大火の記憶を受け継ぐ植樹の促進		樹種検討等		実施・支援		

# 重点プロジェクト施策箇所図



## ① 大火に負けない消防力の強化プロジェクト

- 奴奈川用水や海水等の活用検討
- 消火栓、防火水槽の増強
- 常備消防及び消防団の装備や体制の強化
- 関係機関、団体との応援協定の締結
- 防災意識の醸成

## ② 大火を防ぐまちづくりプロジェクト

- 本町通りにおける延焼遮断帯の形成
- 建築物の不燃化に対する支援
- 市道の拡幅と敷地の再編
- 延焼を防止し住民の集いの場となる公園・広場の整備
- 防災公園の整備

## ③ 糸魚川らしいまち再生プロジェクト

- 雁木の再生に向けた支援
- 地場産材等を活用した復興モデル住宅の推奨
- 外装に統一感をもった住宅や店舗の建築への支援
- 道路や歩道の美装化
- 無電柱化の推進

## ④ にぎわいのあるまちづくりプロジェクト

- 防災とにぎわいの拠点施設の整備
- 商店街等のにぎわい創出事業
- ビジネスチャレンジ支援事業の拡充
- 観光協会と連携した防災等の視察ツアーの実施
- 日本海を生かした長野県方面からの誘客強化

## ⑤ 暮らしを支えるまちづくりプロジェクト

- 公営住宅の整備
- 復興まちづくりカフェの継続
- 生活再建のための金融等の支援
- 生活支援相談員の配置
- 健康づくりへの支援

## ⑥ 大火の記憶を次世代につなぐプロジェクト

- 防災とにぎわいの拠点施設の整備 (再掲)
- 復興まちづくり版マンホール蓋への更新
- 映像等を用いた防災教育の推進
- 防火と大火の記憶を受け継ぐ植樹の促進
